

FABBRIO



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

OBS n° 338/22

PROT. 31/22

SCUOLA/UFFICIO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
SCUOLA ALFIERI	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E REVISIONE N° 5 PORTA FINESTRE ANTICORODAL.	16/02/2022

DESCRIZIONE INTERVENTO




N° MANIGLIE PER PONTO ANDE E NON DA C/VEDI
FOTO ALLEGATE - ESTERNO
7

SE CHIEDE FABBRIO X FORNITURA E POSA DI MANIGLIE X
INFISSE IN ANTICORODAL.

X AFFIDAMENTO LAVORO
16/02/2022

INFRATARAS S.P.A. con Socio Unico
I.V.P.
Ing. Cosimo MANTU

ATTESTAZIONE DEL D.E.C.

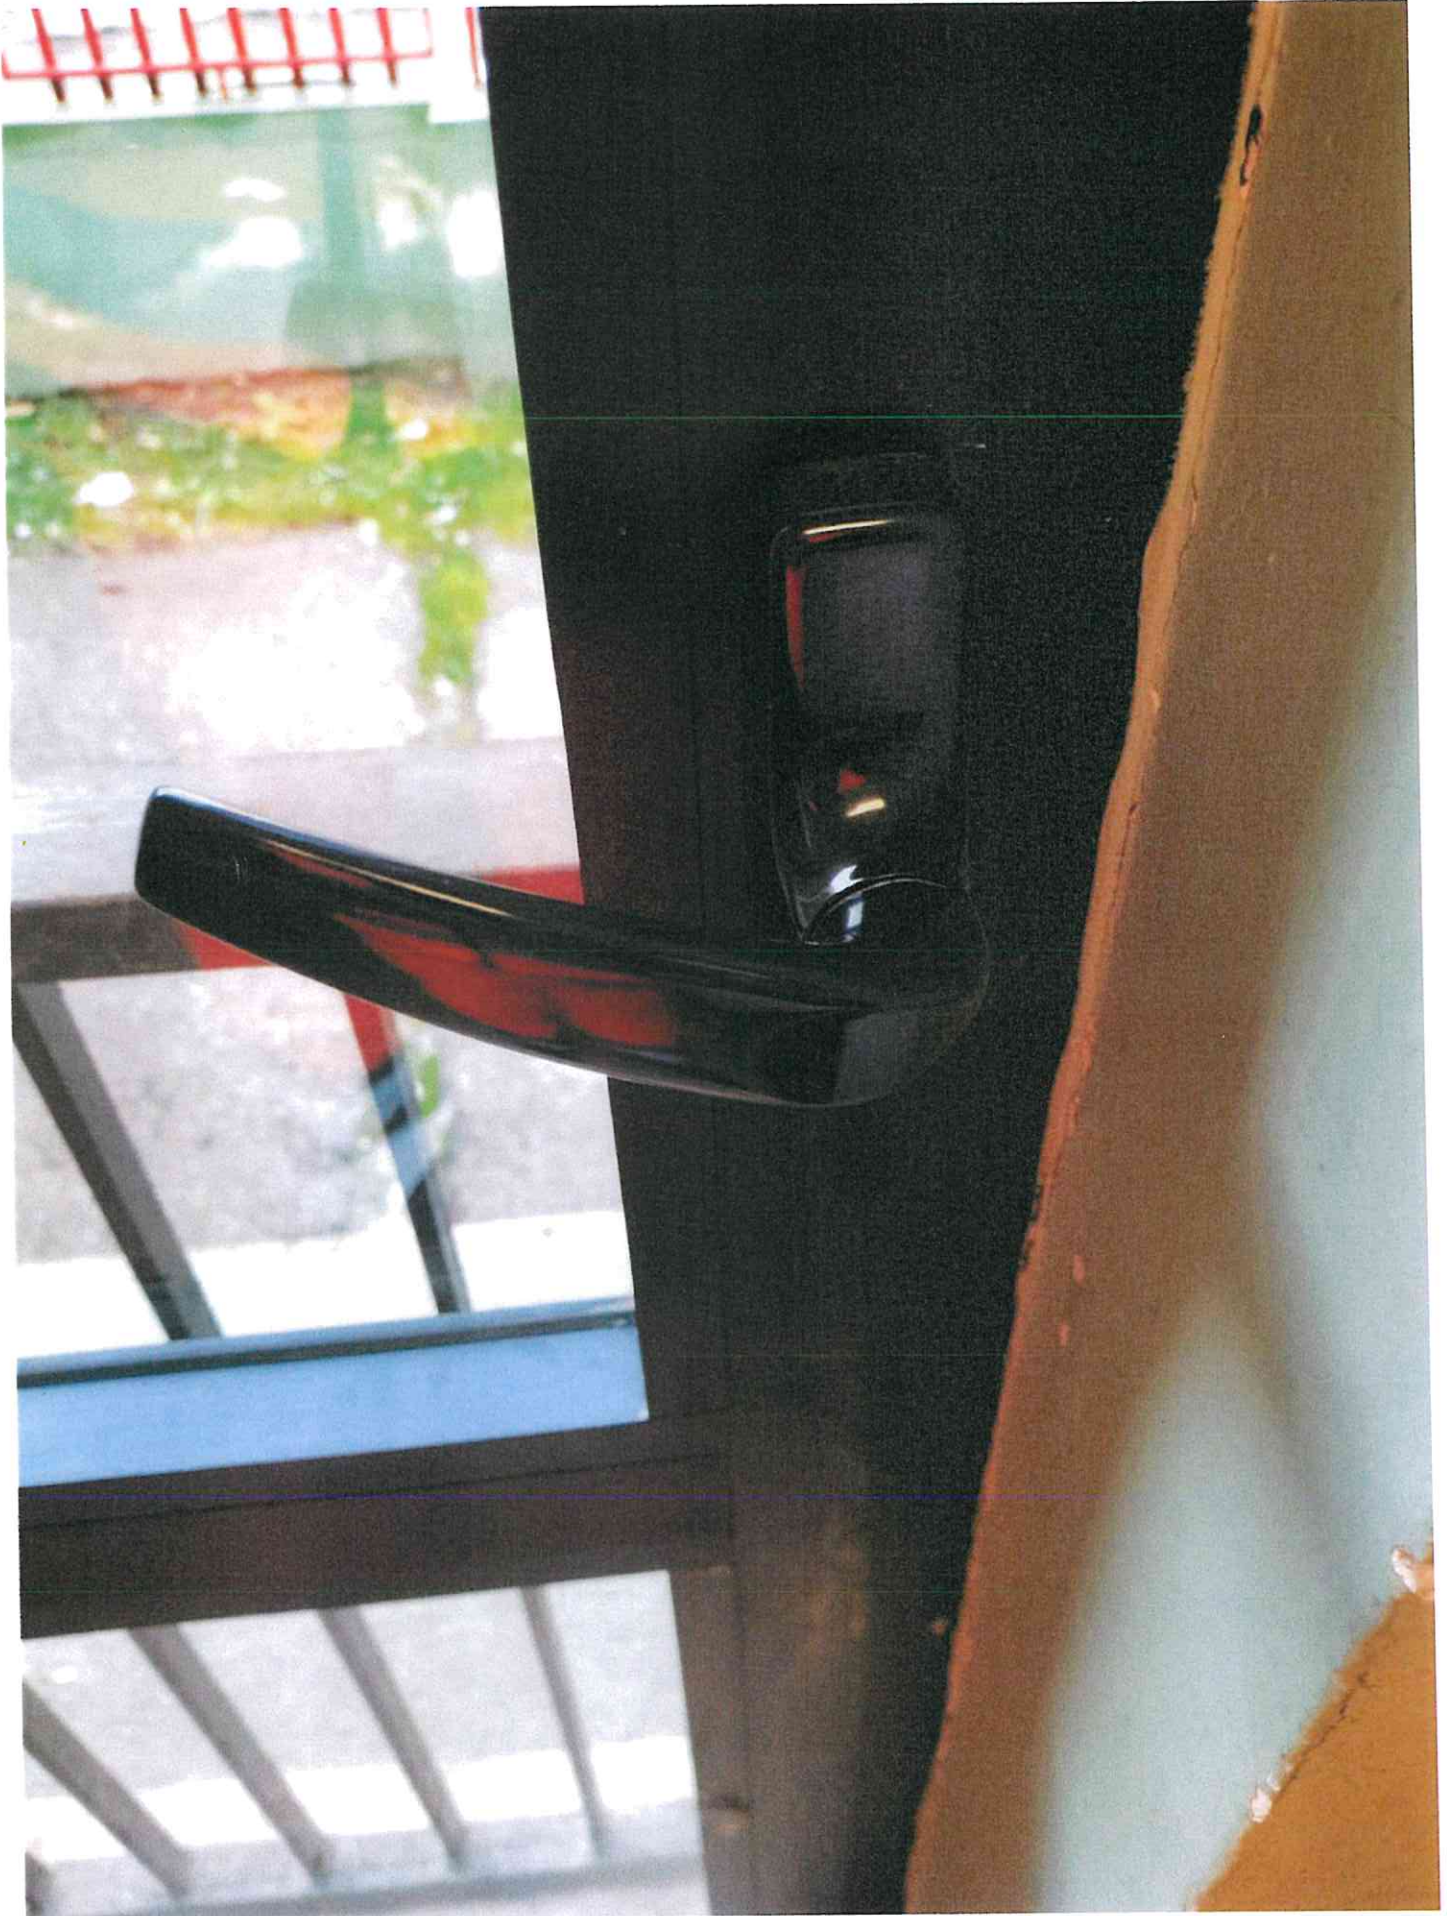

Sc. DON MILANI



Sc. Don McLANI



ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO PROGRAMMATO

OAS n° 70/21 + 197

PROT. 413/21 - PROT. 520/21

SCUOLA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FIRMA E TIMBRO DEL REFERENTE
ASILO ZERO TRE	EPILÈ	31/1/2022

SOPRALLUOGO "CAPONE"

DESCRIZIONE INTERVENTO

DITTA ESECUTRICE DI ALTRI LAVORI ALL'ASILO (LUCARELLI/LUCARELLA-DITTA) CHE DOVEVA EFFETTUARE LE LAVORAZIONI RICHIESTE. NON HA ESEGUITO COMPLETAMENTE GLI INTONACI ESTERNI. Dim. 50 mt L x 5 mt H.

LAVORI DA ESEGUIRE: APPLICAZIONE DI UNA PRIMA MANO D'INTONACO - APPLICAZIONE DI UNA MANO D'INTONACO A FINITURA - PITTURAZIONE DI DUE MANI DI QUARZO BIANCO - MATERIALI 20 confezioni di PREMISCE TO 1° MANO - 35 confezioni di INTONACO A RIFINITURA - 20 LATTE DI QUARZO BIANCO - RITR. MATTONELLE IN LINDOLO 40 MATTONELLE 20x20 - GIORNI PREVISTI LAVORATI 25 - 5 GIORNI PER LAVORI INTERNI.

NB. CHIEDERE PREVENTIVO AD UNA DITTA ESTERNA PER RIPRISTINO INTONACO PARETE (SOLO PRIMA E SECONDA MANO) + SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE BALLATOIO (ESTERNO). 17/04/2022

ATTESTAZIONE DEL D.E.I.

INFRATARAS S.P.A. con Socio Unico
 I.R.U.P.
 loc. Coorno MANTOVA
